

※掘削除去措置における計画と実施の相違点（まとめ）

	計画内容	実施内容	変更の有無	変更理由
対策範囲	対策面積：283 m ² 【別紙1 参照】	対策面積：283 m ² 【別紙2 参照】	なし	
汚染土量	掘削土量：491 m ³ 【別紙1 参照】	掘削土量：423.2 m ³ 【別紙2 参照】	あり	地中障害物があつた為減少した。
対策方法	掘削除去	掘削除去	なし	
完了確認	・メジャー・スタッフ等を用いて確認し、その状況を写真撮影	・メジャー・スタッフ等を用いて確認し、その状況を写真撮影	なし	
汚染土搬出先	- 五洋建設株式会社 市川土壌再利用センター（浄化等（不溶化）・分別等処理施設） 所在地：千葉県市川市千鳥町14番地 TEL：047-307-9260 FAX：047-307-3129 - 泉工業株式会社 市川リサイクルセンター（分別等処理施設） 千葉県市川市二俣新町22番地1 TEL：047-328-2615 FAX：047-328-2618	五洋建設株式会社 市川土壌再利用センター（分別等処理施設） 所在地：千葉県市川市千鳥町14番地 TEL：047-307-9260 FAX：047-307-3129	なし	泉工業（株）には搬出しなかった。
工事工期	2021年1月5日から2021年3月31日まで	2021年1月5日から2021年4月13日まで	あり	工期に関しては管理票返却に時間を要したため延伸した。
環境保全対策	- 飛散防止のための仮囲い - 飛散防止のための散水施設 - 危険回避のための防護柵	- 飛散防止のための仮囲い - 飛散防止のための散水施設 - 危険回避のための防護柵	あり	単位区画1-1について、シートパイルを設置する計画としていたが、汚染土壌が地下水に接しない事を確認し、シートパイルは設置しなかった。


地下水分析結果一覧表

(単位:mg/L)

単位区画名	対象物質	施工前 採取日	施工後 採取日	地下水基準
1-1	砒素及びその化合物	0.005未満 2020年11月2日	0.001未満 2021年4月3日	0.01以下
1-4	砒素及びその化合物	0.005未満 2020年11月2日	0.001未満 2021年4月3日	0.01以下
2-2	セレン及びその化合物	0.002未満 2020年11月2日	0.001未満 2021年4月3日	0.01以下
	砒素及びその化合物	0.005未満 2020年11月2日	0.001未満 2021年4月3日	0.01以下

※「未満」は、定量下限を下回っていること。

【地下水モニタリング位置図】

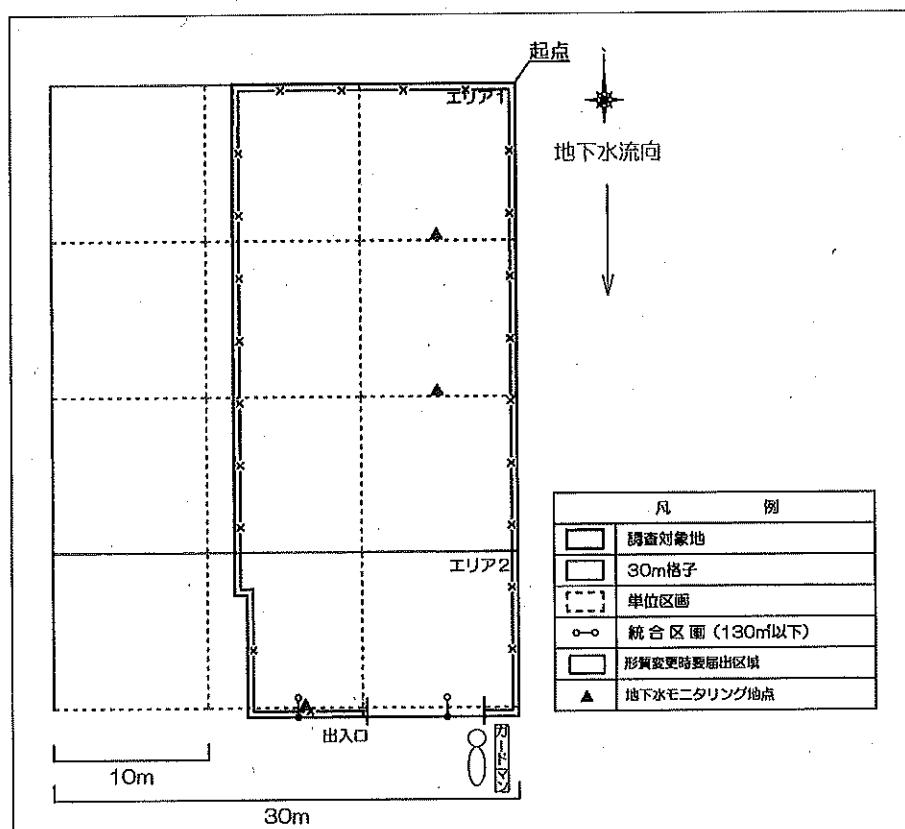


土地の形質の変更の終了後における 当該土地の利用方法を明らかにした図面

所 在 : 東京都墨田区錦糸4丁目10番12、10番13、10番27の各一部

S=1:500



【格子の回転角度 (0度0分)】

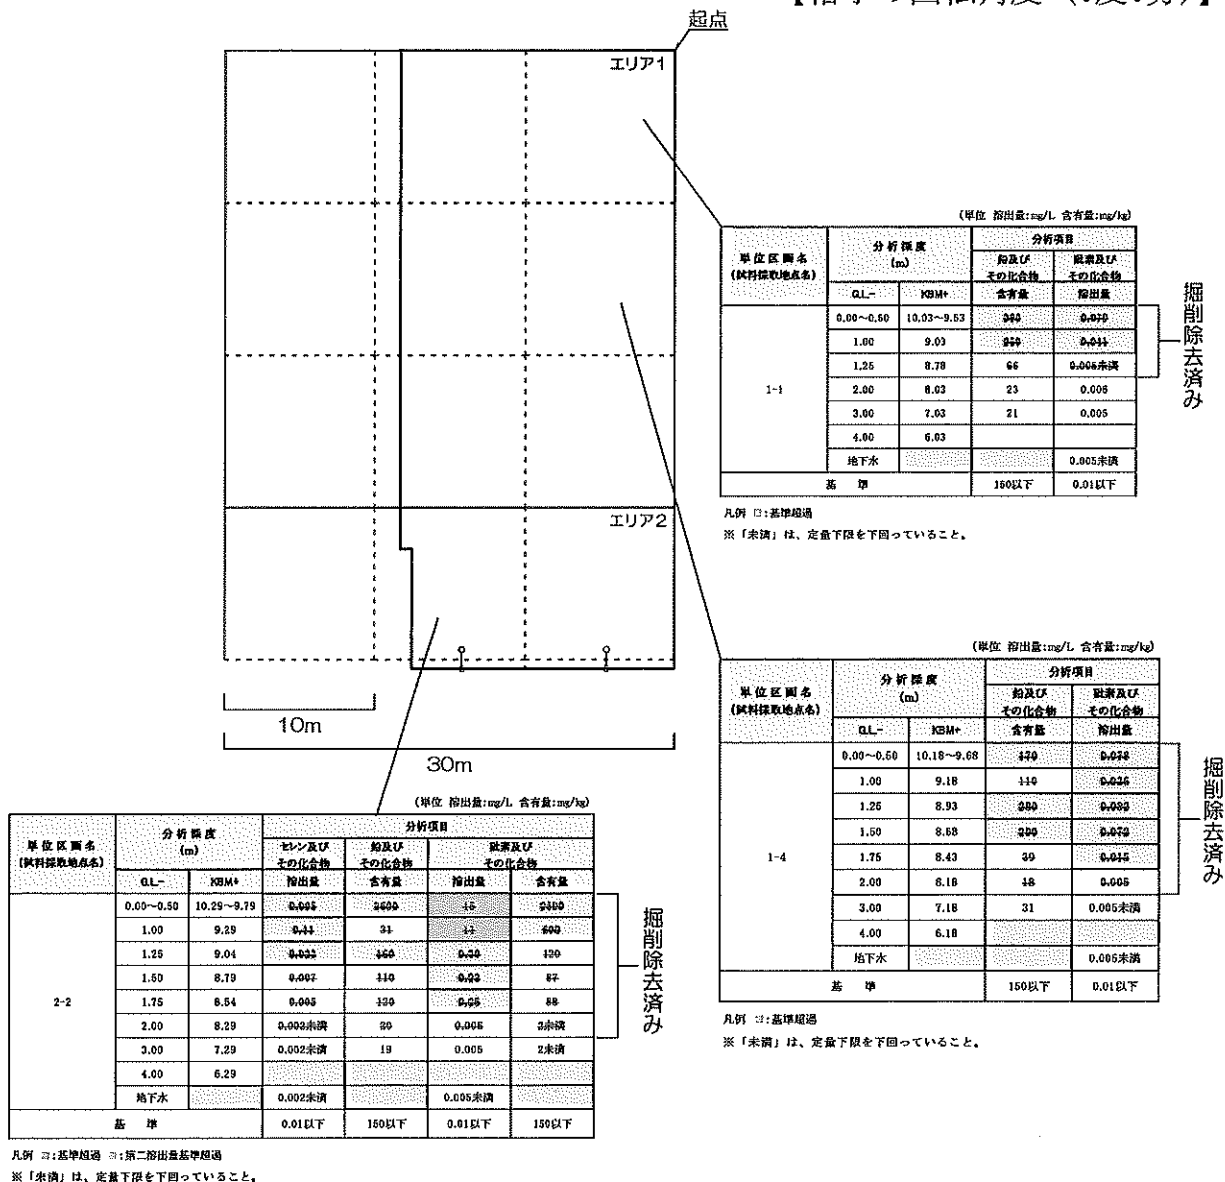

単位区画番号

3	2	1
6	5	4
9	8	7

凡 例	
	調査対象地
	30m格子
	単位区画
	統合区画 (130m以下)
	清浄土に埋め戻された範囲
